



OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄ- SEMINAARI

6.5.2014

Päivän ohjelma

- 12:30 Avaus / Pekka Äikäs hankepäällikkö
- 12:45 Katsaus OTM-hankkeeseen/ Kati Kettunen OTM-hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja, Helsingin yliopisto
- 13:15 OTM-hanke tutkimuskohteena / Riitta Hekkala, Aalto-yliopisto
- 14:00 Kahvi
- 14:30 Kokemuksia ketterästä järjestelmäkehityksestä OTM-hankkeessa / Tommi Ullgren, Mikko Ahonen Codento Oy
- 15:00 Järjestelmäkehityksen tilanne / OTM projektiryhmä
- 15:30 KYSY OTM:stä / OTM johto- ja projektiryhmä
- 16:00 alk. Viiniä, pientä purtavaa ja puhetta

AJATUKSIA OTM-HANKKEESTA

OTM-hanke


- Työyhteenliittymänä toteutettava ketterä kehityshanke opintohallinnon tietojärjestelmien uudistamiseksi

Työyhteenliittymä




- Ei omaa kassaa, sopimukset ja muut hankinnat aina jonkin osapuolen kautta
- Ei omaa henkilökuntaa, osapuolet luovuttaneet parhaita osaajiaan projektiryhmään
- Yhteinen visio ja tahtotila mahdollistavat onnistumisen
 - Johtoryhmän rooli keskeinen tahtotilan muodostamisessa
 - Projektiryhmä muodostaa järjestelmän toiminnallisen vision ja ohjaa sen toteutusta

Ketterät menetelmät

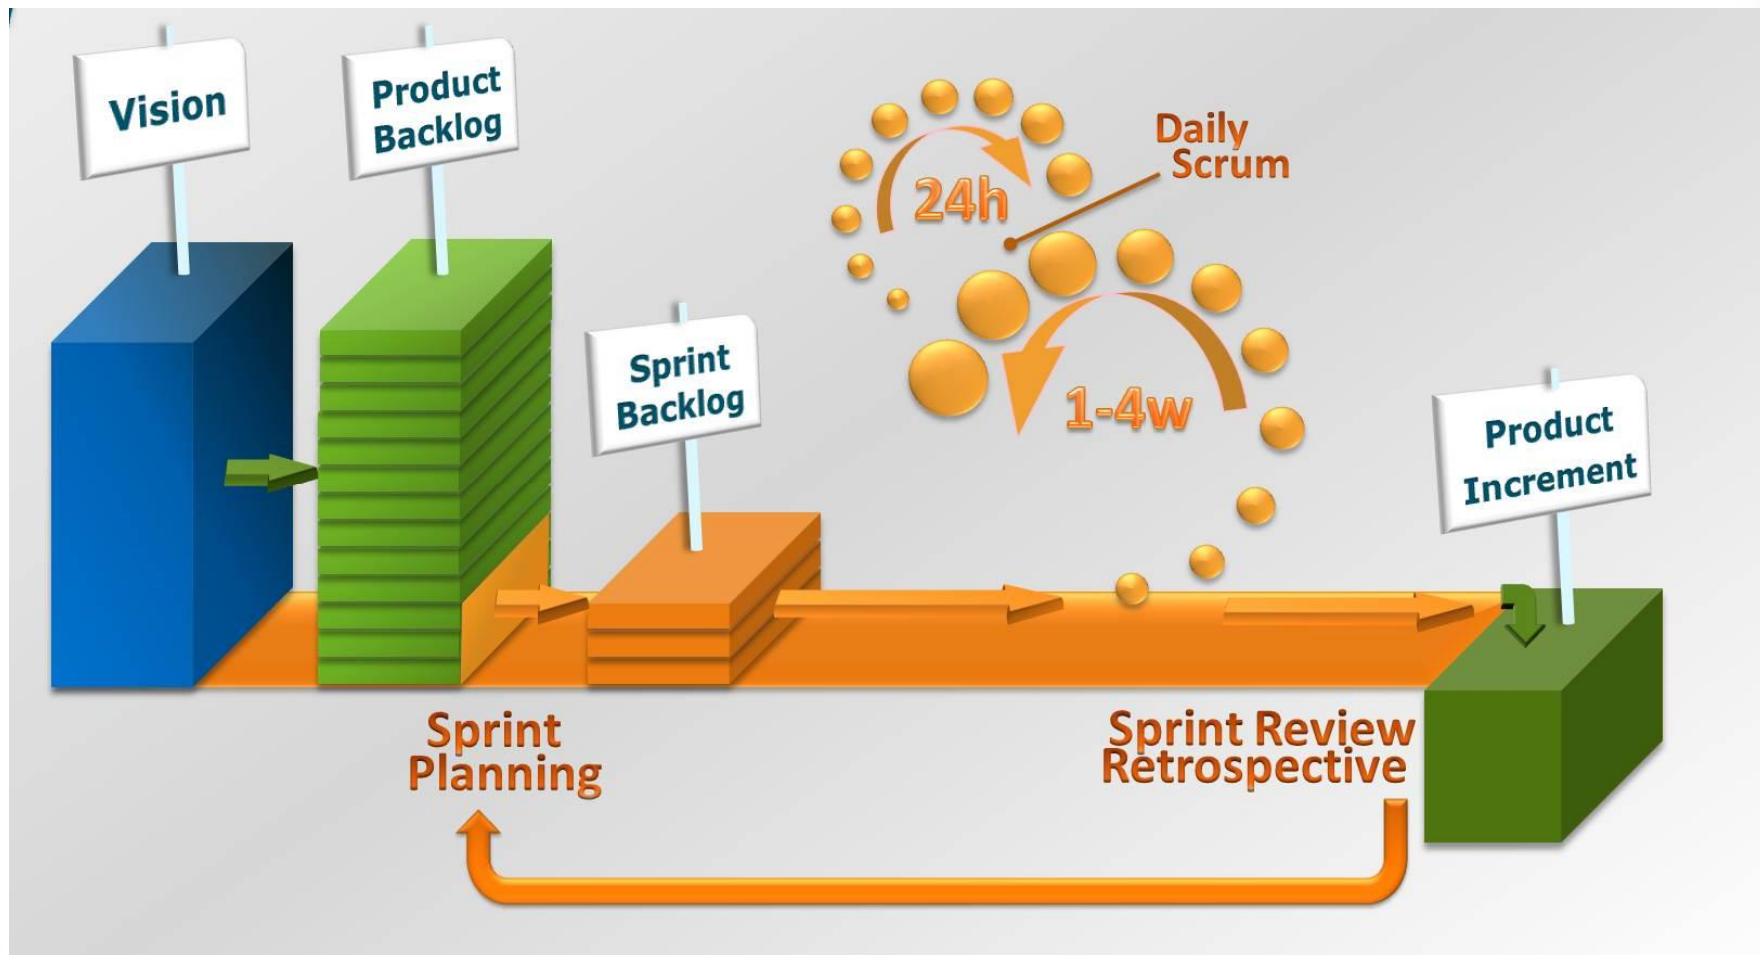

Ketterä hanke

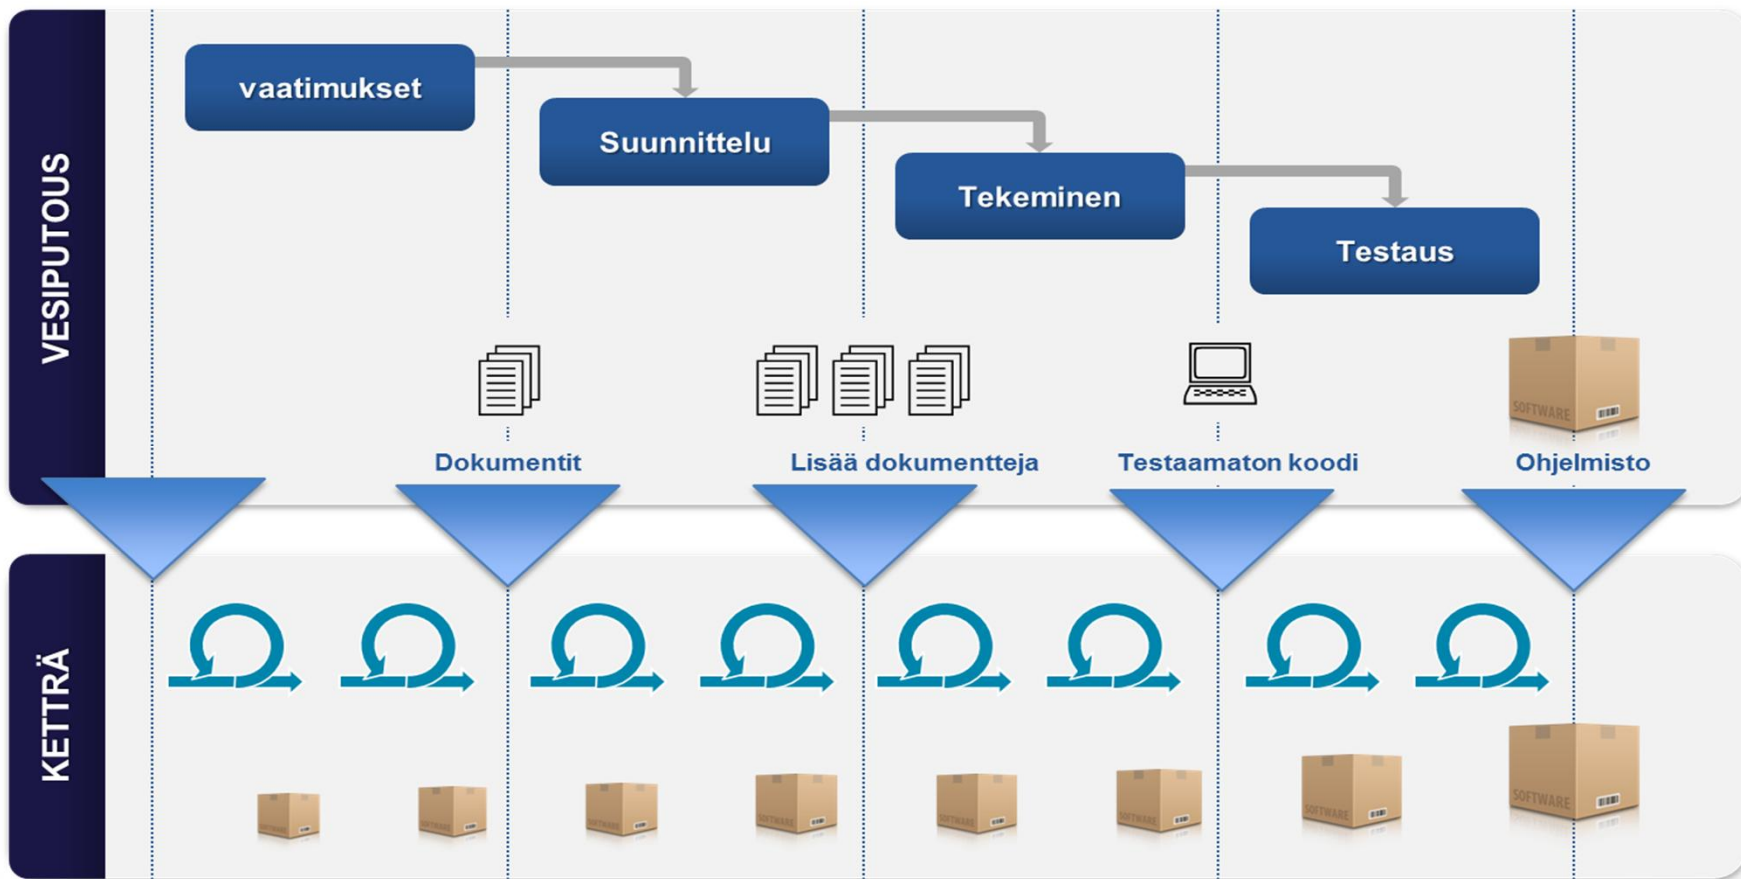

Kehityshanke

- Toteutusvaihe vuosia, ylläpito- ja jatkokehitysvaihe 10+ vuotta
- 80/20 –sääntö ohjaa tavoitetasoa, ei heti täydellistä
- Kehitetään sekä sovellusta että toimintaa, jota sovelluksella tuetaan
- Käyttöönotto edellyttää erilliset integraatio- ja liitosprojektit




Tietojärjestelmä uudistus

Software Development - Microsoft Project Preview

Task Name	Duration	Start	Finish
Software Development	107 d	Mon 02.08.10	Tue 28.10.10
Determine project scope	3.5 d	Mon 02.08.10	Thu 05.08.10
Secure project sponsorship	1 d	Mon 02.08.10	Tue 03.08.10
Define preliminary resources	1 d	Tue 03.08.10	Wed 04.08.10
Secure core resources	1 d	Wed 04.08.10	Thu 05.08.10
Scope complete	0 d	Thu 05.08.10	Thu 05.08.10
Analysis/Software Requirements	14 d	Thu 05.08.10	Wed 25.08.10

Opintohallinnon järjestelmän liitännöiden tavoitteita 2016

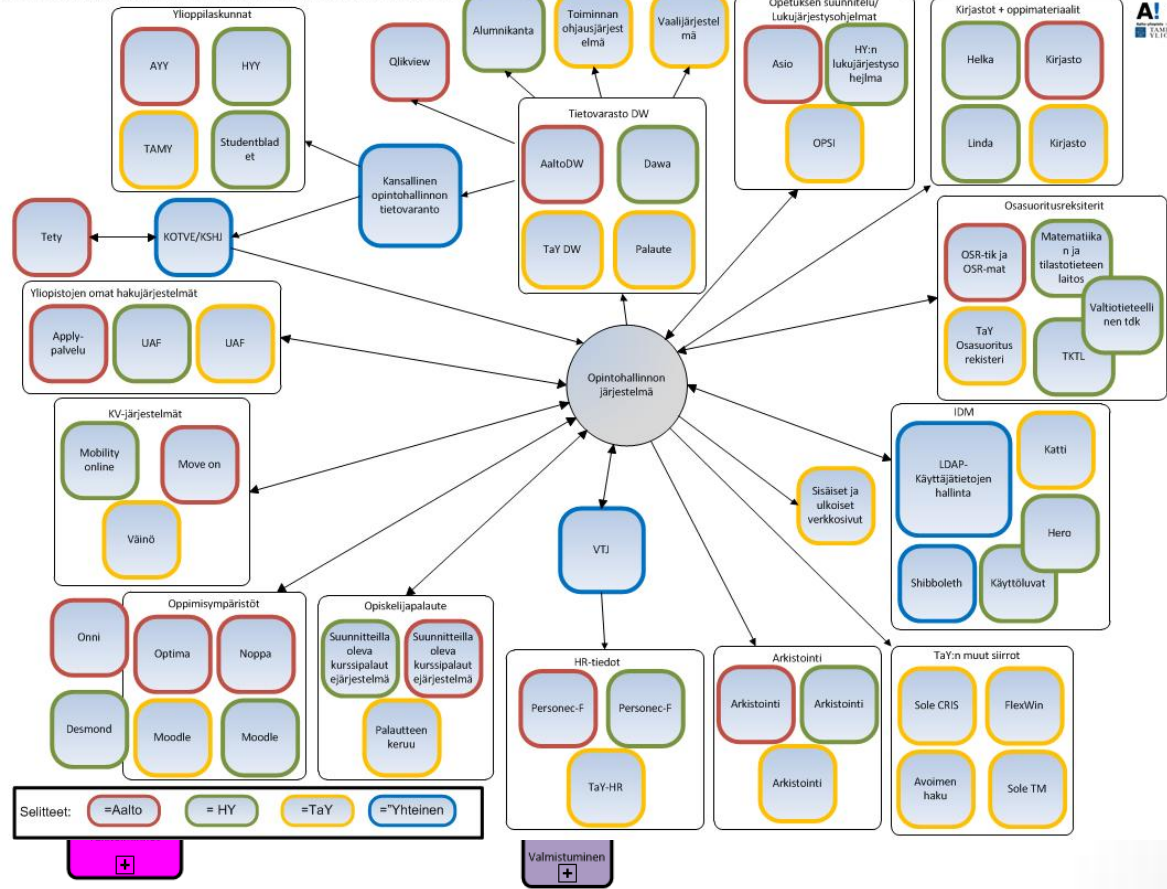

- = OTM-projektissa
- = osin OTM-projektissa
- Raportit ja tilastot
- Viestintä
- Ohjaus ja neuvonta

Date	Issue	Event Type	Event Detail	Inc.	Dec.	Remaining
28/04/2014 14:35	OTM-176	Sprint start		-		
	OTM-329			-		
	OTM-543			0		
	OTM-564			1		

Tietojärjestelmä uudistus

The screenshot displays the Opmintoni web application interface. On the left is a sidebar for course selection, listing various subjects like 'Differential- ja integraalilaskenta 1 (T02)' and 'Filosofian maisteri, suomen kieli 2012-13'. The main area is divided into three sections: 'Aikajana' (Timeline) showing a Gantt chart for projects like 'Tehdasprojekti' and 'Tuotantoautomaatio' across months from August to December 2013; 'Ryhmävalinta' (Group selection); and 'Kalenteri' (Calendar) showing a monthly view for May 2014. The browser address bar shows 'https://otm-sandbox.it.helsinki.fi/aalto/#/main'.
